




Højfde 42 og Cheminovas Gl. Fabriksgrund

ATV gå-hjem-møde
19. November 2024

Halfdan Sckerl

Generationsforureningerne på Harboøre Tange



Oprensning af Høfde 42 depotet



Høfde 42 depotet

Mængder:

>100 tons forurening

68 t parathion

10 t malathion


4 t methyl-parathion

6 t E-sulfotep

7 t kviksølv

+ andre stoffer



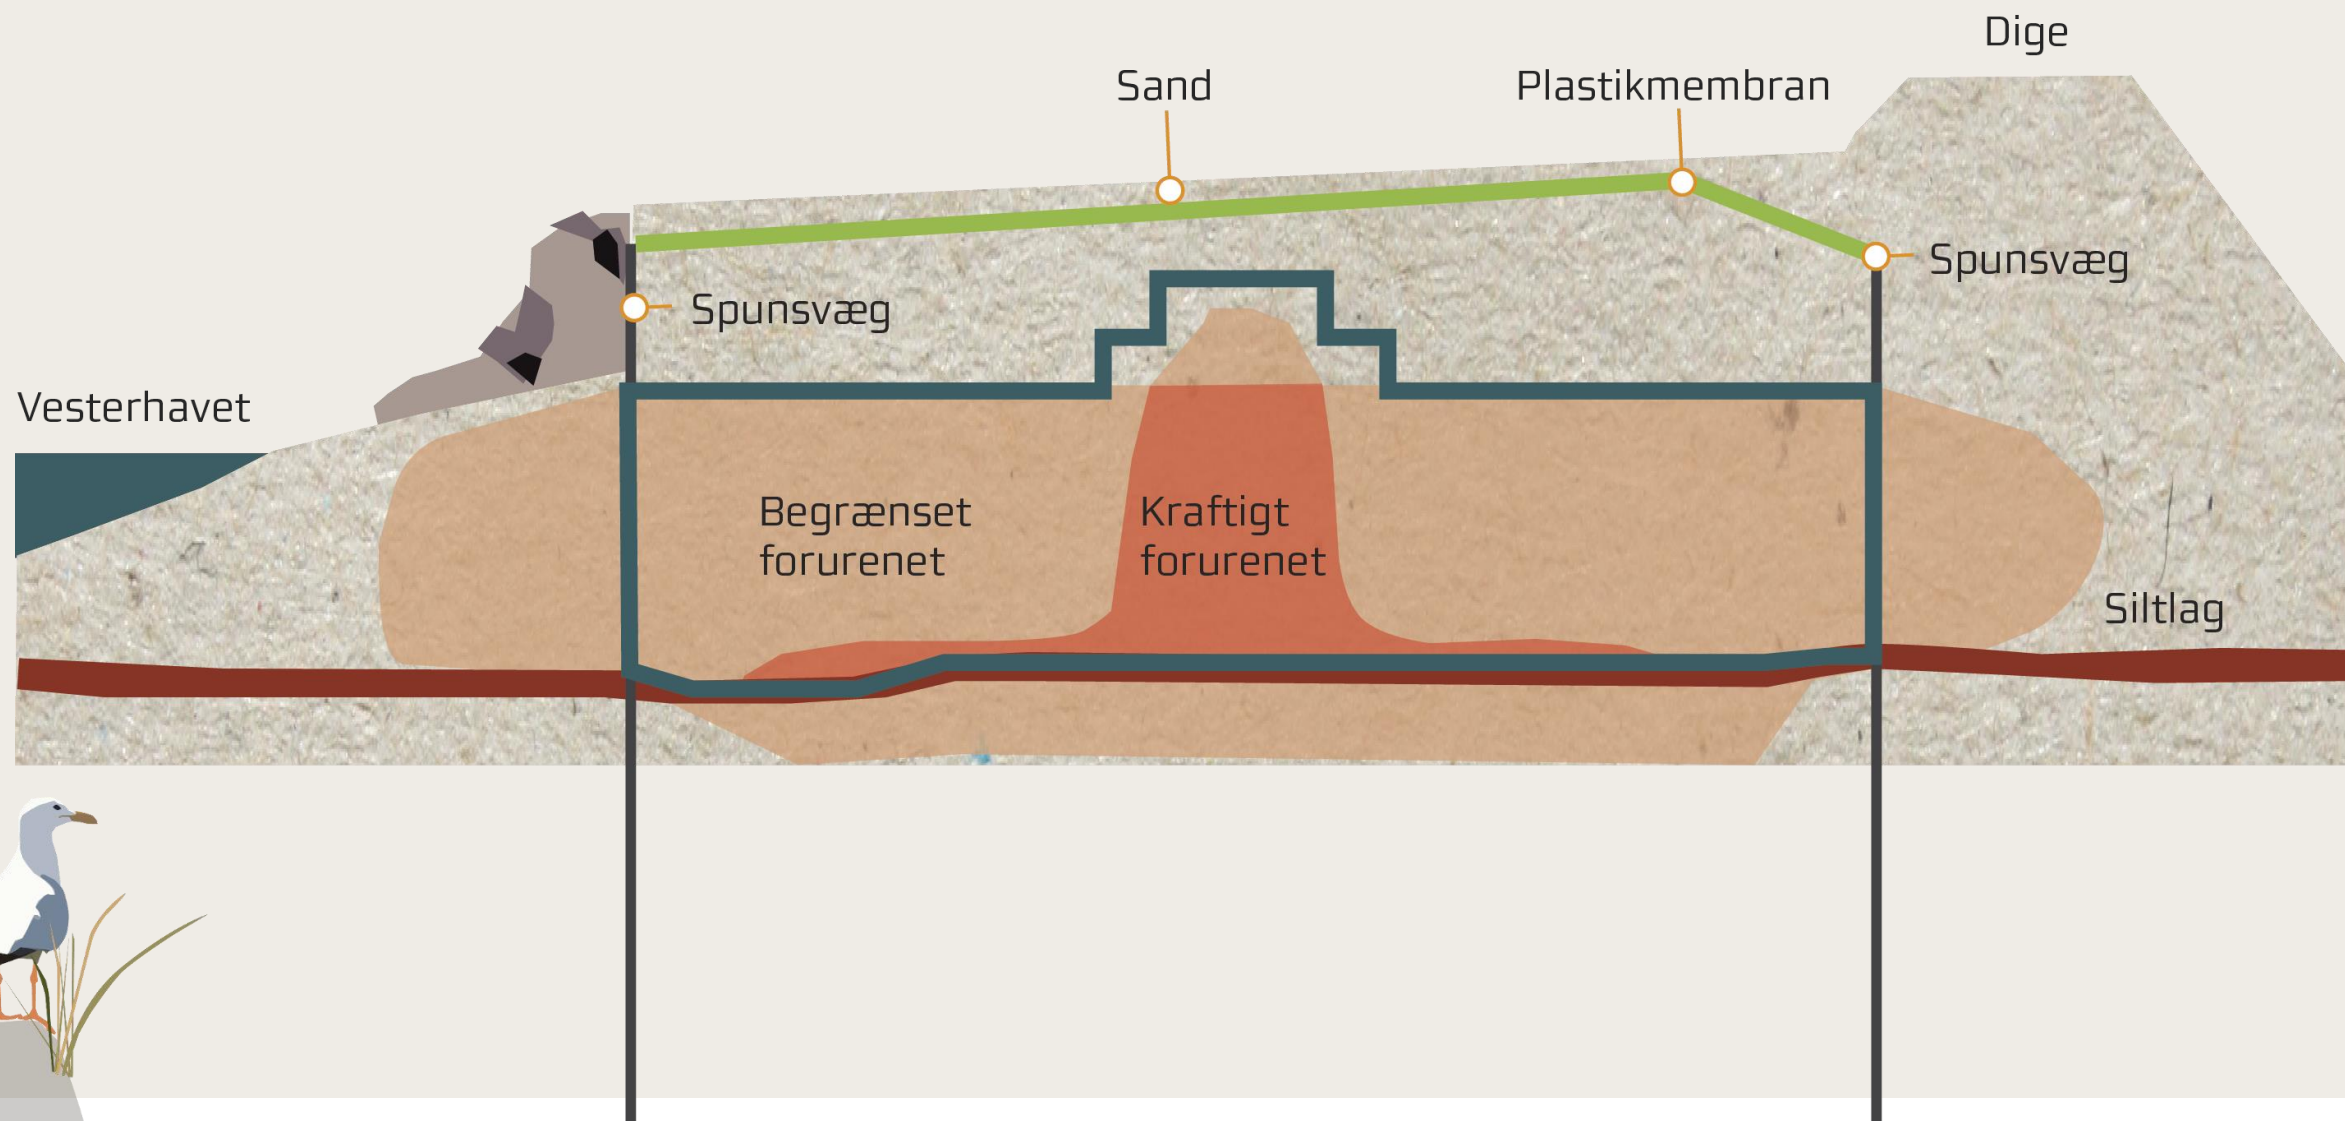


Formål med oprensning

At fjerne forurening i et sådan omfang, at en restforurening ikke udgør en risiko for mennesker og miljø

Reduktionen i forureningsmasse skal have et omfang, så der efterfølgende ikke vil være brug for at drive et anlæg til afværge i depotområdet.

Det er forventningen, at de forbud omkring badning, dykning og fiskeri, der i dag findes i området, vil kunne ophæves efter endt oprensning.

Oprensningen følger principperne for regionernes indsats, som fastlagt i Jordforureningsloven

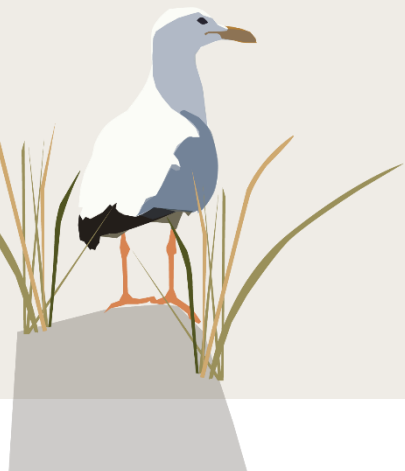


Udfordringer

- Akut toksiske stoffer – arbejdsmiljø har topprioritet
- Geografisk beliggenhed
 - Følsom natur – Natura2000
 - Tæt på Vesterhavet
 - Behov for at fjerne diget
- Kompleks forurening
- Aldrig gjort før!




#virenselop
#renhøfde42
#generationsforurening



Tidsplan

- Indhente myndighedstilladelser min 2½ år (pt bedste bud er 1. kv. 2027)
- Selve oprensningen – fast tidsramme på 4 år fra myndighedsgodkendelse
- Undersøgelser efter endt oprensning pba. Ministerens henvendelse
- Retablering af området





Indspunsning af gl. fabriksgrund



Plan

- Indspunse forurening – 100 millioner
- Udvikle mere økonomisk bæredygtige metoder
- Oprense forureningen
- Udbudsstrategi politisk vedtaget


Forventet placering af spunsen

Spuns:

- Omkreds ca. 750 meter
- Areal ca. 23.000 m²
- Volumen ca. 280.000 m³ jord


Det er omkring tre gange så meget jord som på Høfde 42.



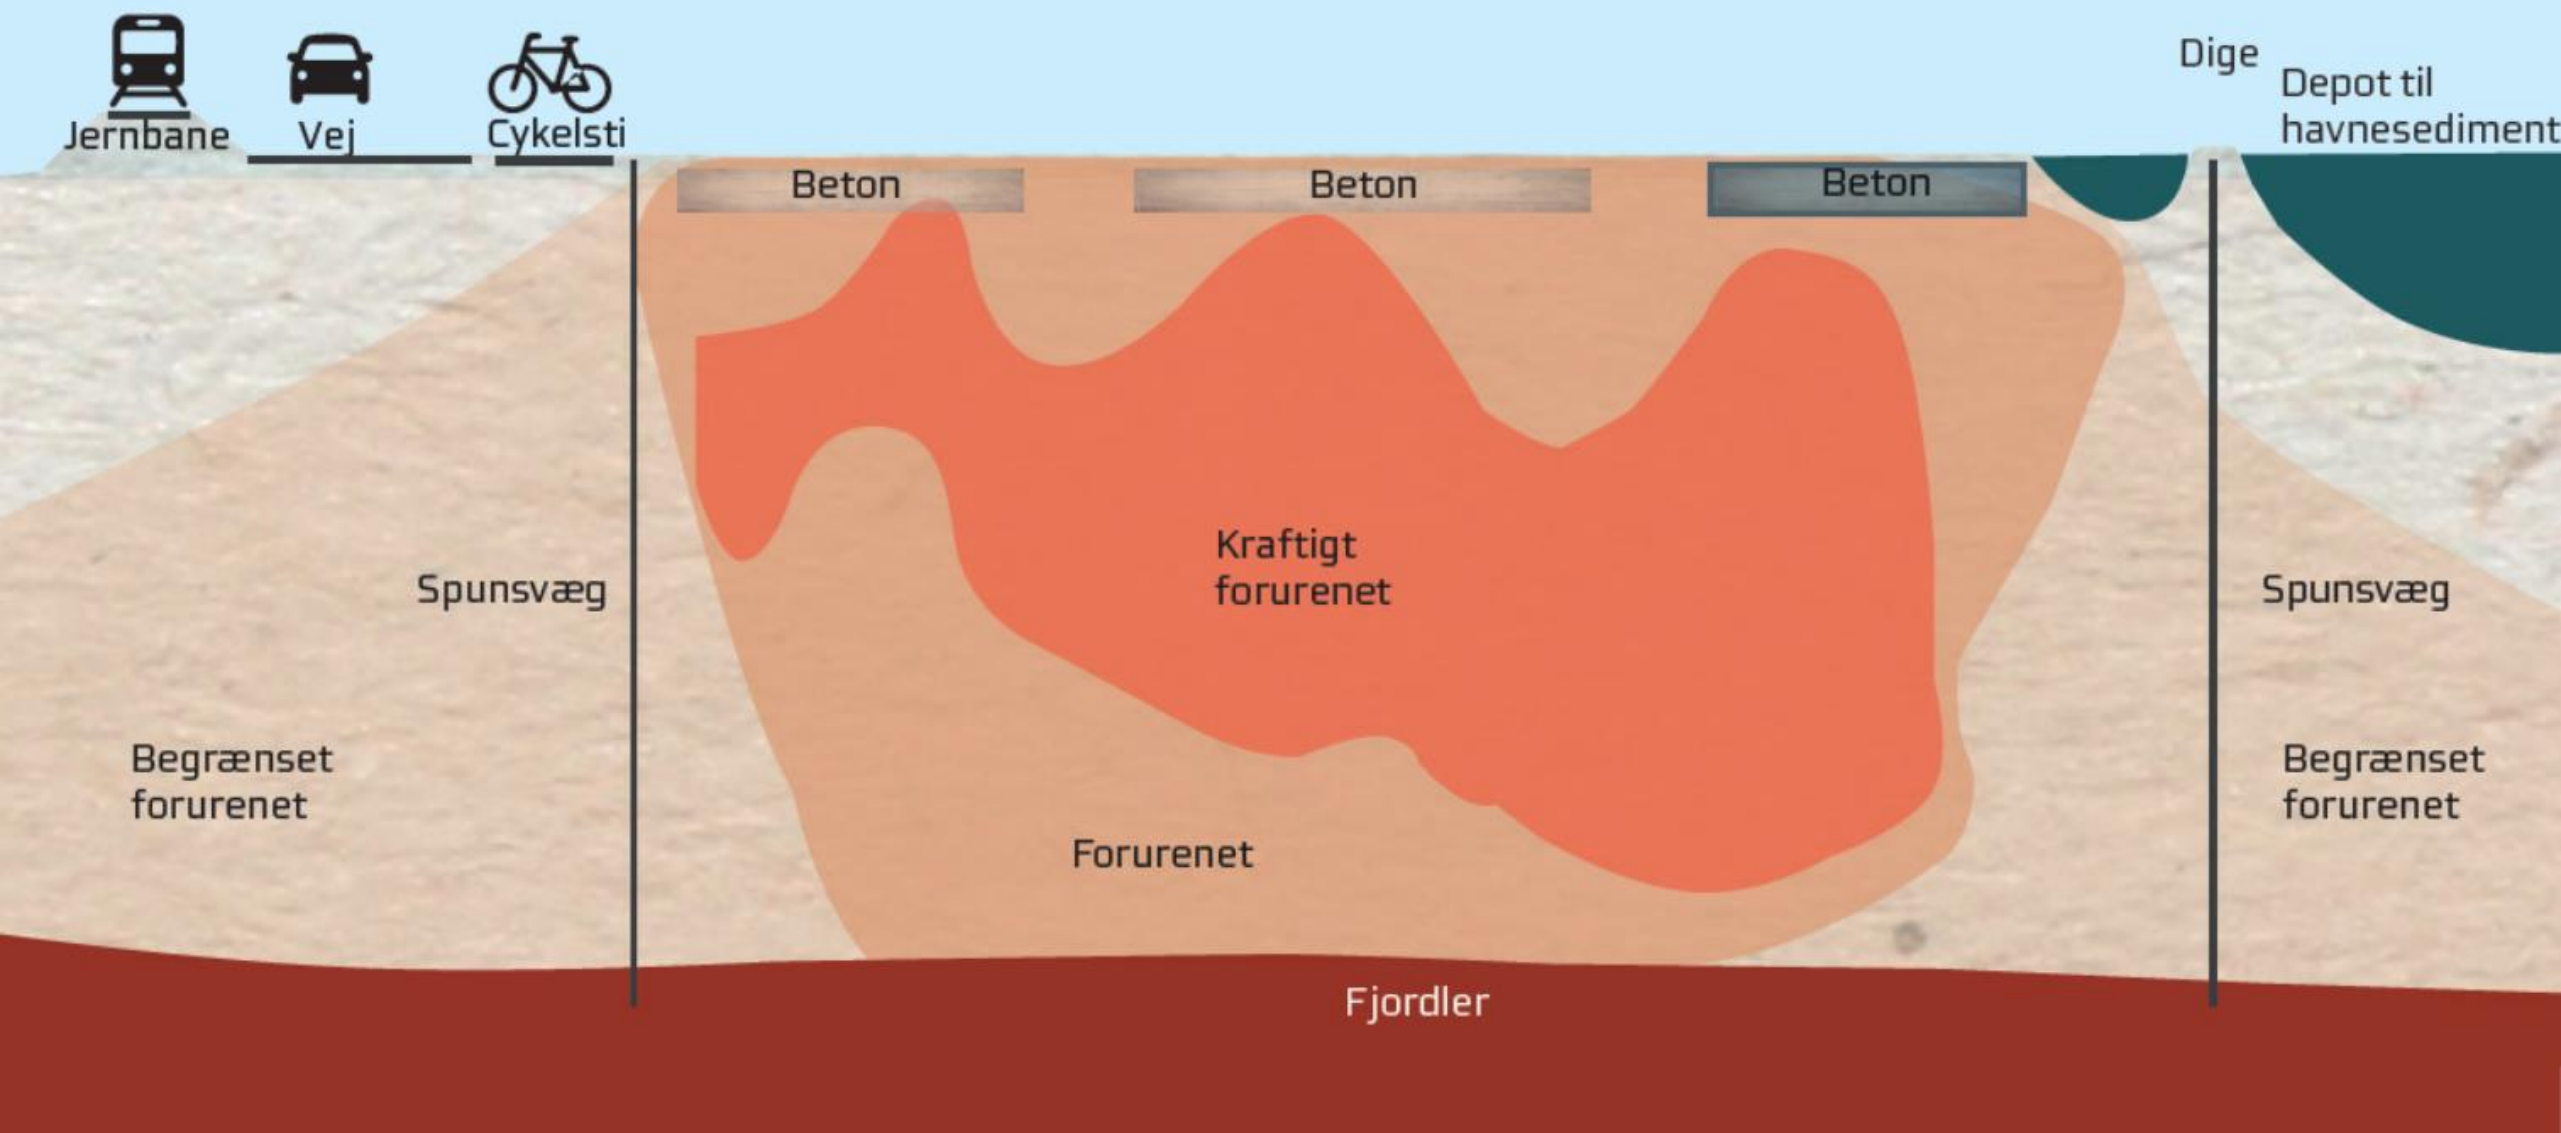

Lige nu

- Afklaring i forhold til infrastruktur ejere
- Naturregistrering under afrapportering
- Væsentlighedsvurdering ift. Natura2000
- Afklaring af tekniske løsninger med spuns
- Undersøgelsesboringer
- Beslutning om placering af spuns



Tidsplan



Dato/periode	Aktivitet
Oktober 2024	Politisk behandling af udbudsstrategi
Forventet 2. halvår 2025	Projektet har modtaget de tilladelser, der skal til for at det kan sendes i licitation. Tidspunktet er meget afhængig af hvilken myndighedsbehandlingsproces der er nødvendig , hvilket ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.
1 måned efter modtagelse af tilladelser	Udbudsmateriale er færdigt og udbuddet offentliggøres
2 måneder efter offentliggørelse af udbud	Frist for afgivelse af tilbud
2. kvartal 2026	Kontraktindgåelse



#virenselop
#Høfde42
#generationsforurening

Spørgsmål?

